

PROCESSKEMAET.

Formål med skemaet:

Processkemaet kan benyttes til at få et overblik over renoveringsprojektets forløb, og være et redskab til overblik over beslutningsforløbene i en renovering. Sammen med beslutningsnotaterne danner processkemaet hele det dokumenterende beslutningsgrundlag i totalværdimodellen.

Sådan bruges skemaet:

Hent processkemaet inde på www.totalvaerdimodellen.dk under dokumenter

Gem processkemaet på egen PC


Skriv dato for renoveringsprojekts begyndelse.

Skriv konklusionen fra beslutningsnotatet om AFSÆT i første ramme.

Gå til faneblad GATE21 i værktøjslinjen øverst

Tilføj ramme

Når projektet går videre til næste rum, markeres dette med en pil, og der skrives en konklusion fra AFKLARING.

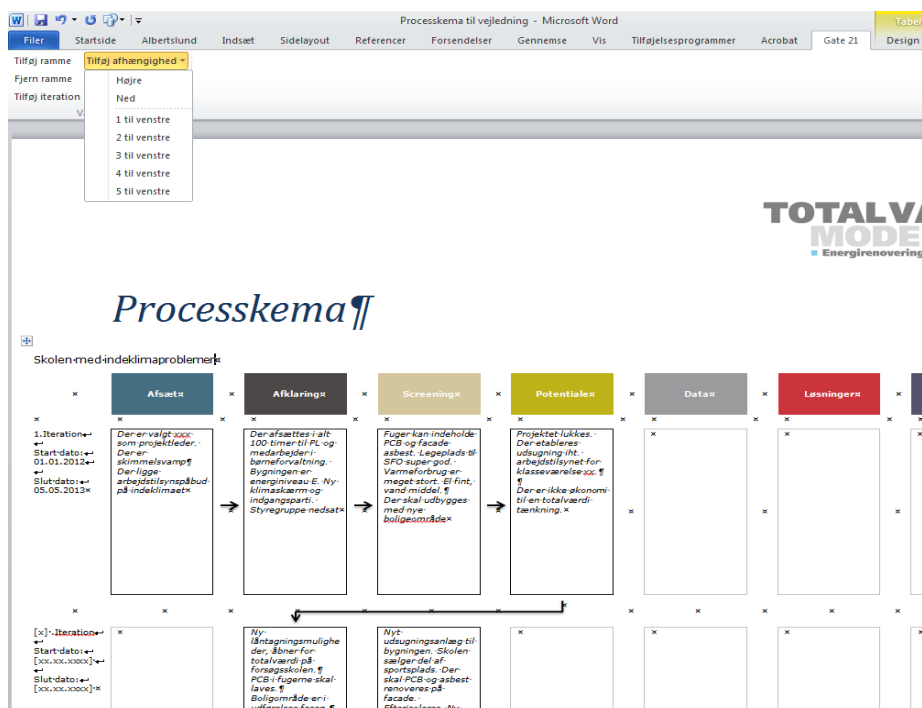

Hvis projektet, af en eller anden grund stopper eller der sker en ændring i projektes der gør at man er nødt til at gå tilbage i de forrige rum, startes en nye iteration. Der kan være et behov for at vise denne udvikling med pile.

Når du står i rammen, kan du klikke på TILFØJ AFHÆNGIGHED og der sættes en pil til højre hvis man bare skal til næste rum, eller ned og til venstre afhængig af hvor man skal tilbage, hvis man starter en nye iteration.

Hvis man i renoveringsprojektet har behov for endnu en iteration, kan denne tilføjes, ved at trykke på "TILFØJ ITERATION.

En iteration er en projektudvikling, hvor man har et behov for at gå "tilbage" i processen og gentage eller opsamle ny viden

